Контейнер 1 из двух: двадцатифутовый, Владивосток — Петербург

Вид сбоку, разрез по длине

Внутри 5.90 x 2.39 м. Масштаб честный: где пусто на рисунке, там пусто и в контейнере

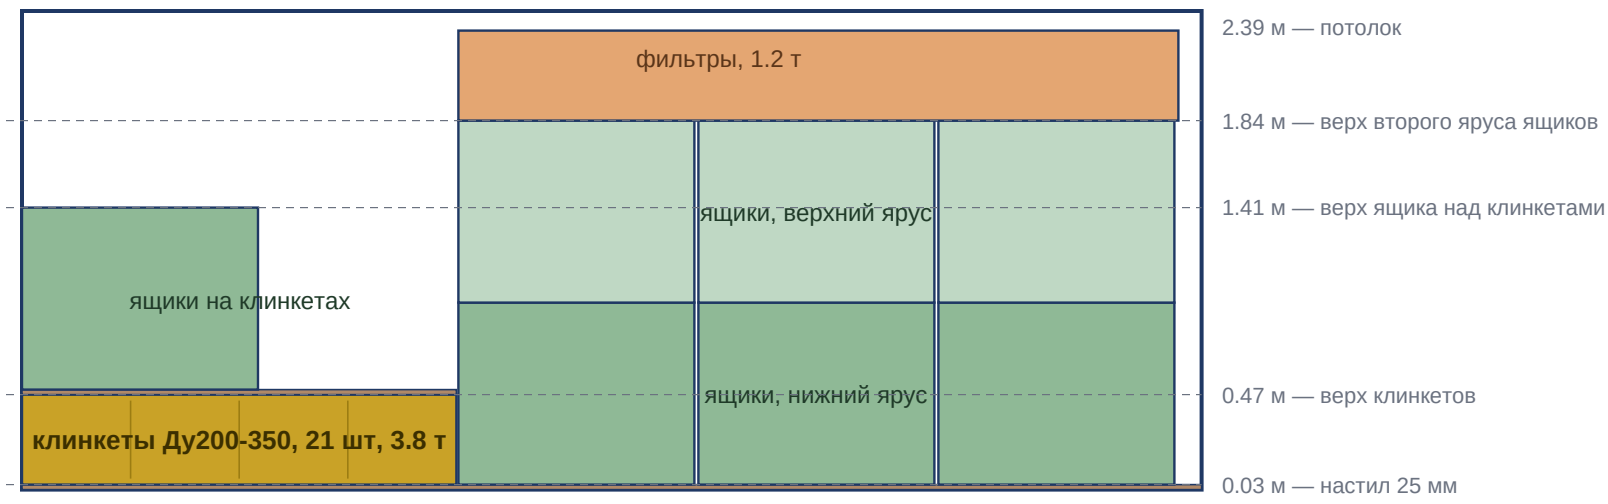

Вид сверху, план пола

Пол 5.90 x 2.35 = 13.9 кв. м. Клинкеты занимают 5.1 кв. м, это 37% пола

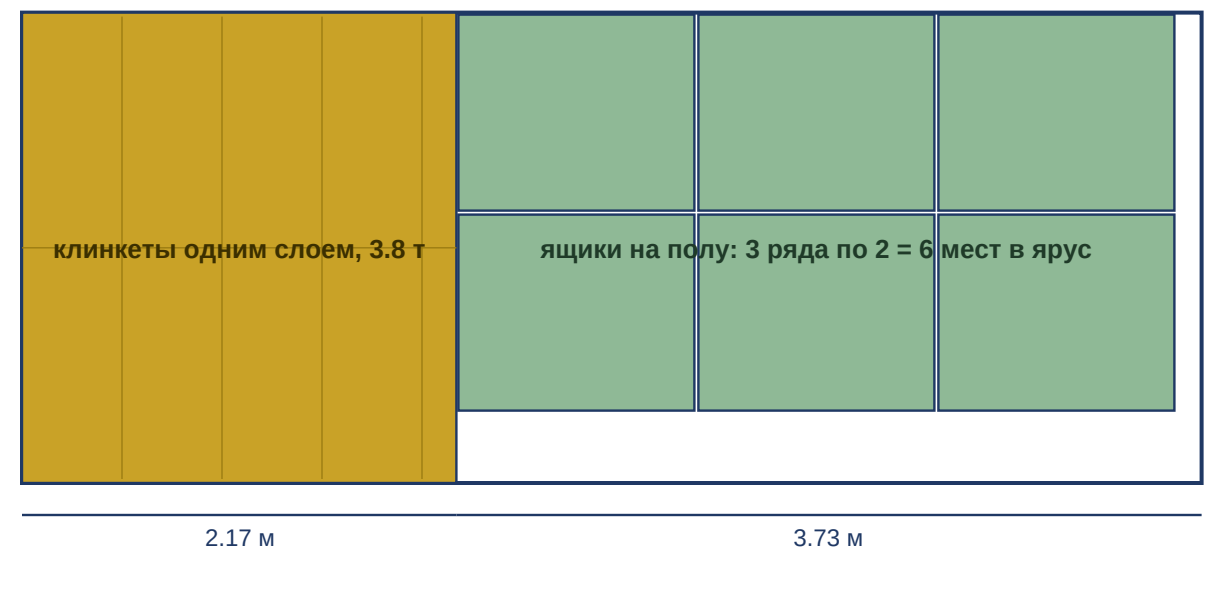

Порядок погрузки

1. Настил необрезной доской 25 мм по всему полу
2. Клинкеты Ду200-350 лежа, один слой: 21 шт, 3.8 т
3. Настил доской поверх клинкетов, над корпусами, а не над маховиками
4. Ящики нижнего яруса, самые тяжелые: всего ящиков 12, 7.2 т
5. Ящики верхнего яруса, что полегче
6. Фильтры сверху, 1.2 т, над углами ящиков

— Всего в контейнере: 106 позиций, 1951 штук, 13.77 т из 22, 19.2 из 33.0 куб. м

— Во Владивостоке не остается ничего

— Ящик не выше 0,91 м, иначе второй ярус не встает под потолок

— Доска: 24 штук по 4 м, 0.48 куб. м, 337 кг

Контейнер 2 из двух: двадцатифутовый, Владивосток — Петербург

Вид сбоку, разрез по длине

Внутри 5.90 x 2.39 м. Масштаб честный: где пусто на рисунке, там пусто и в контейнере

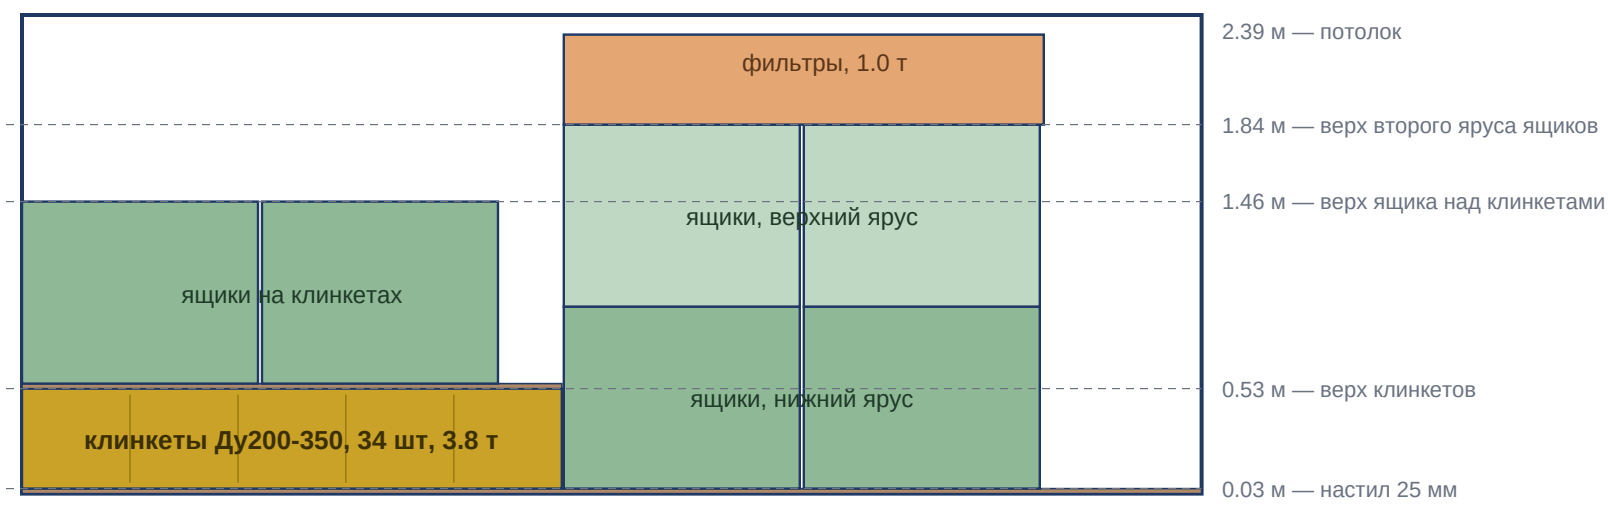

Вид сверху, план пола

Пол 5.90 x 2.35 = 13.9 кв. м. Клинкеты занимают 6.3 кв. м, это 46% пола

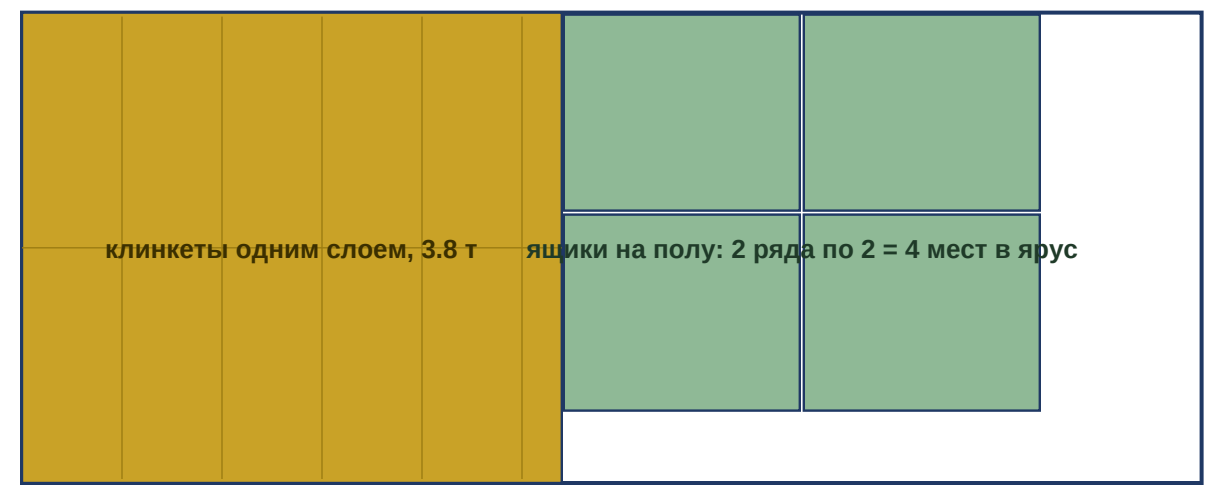

Порядок погрузки

1. Настил необрезной доской 25 мм по всему полу
2. Клинкеты Ду200-350 лежа, один слой: 34 шт, 3.8 т
3. Настил доской поверх клинкетов, над корпусами, а не над маховиками
4. Ящики нижнего яруса, самые тяжелые: всего ящиков 12, 7.0 т
5. Ящики верхнего яруса, что полегче
6. Фильтры сверху, 1.0 т, над углами ящиков

— Всего в контейнере: 127 позиций, 952 штук, 13.54 т из 22, 19.5 из 33.0 куб. м

— Во Владивостоке не остается ничего

— Ящик не выше 0,91 м, иначе второй ярус не встает под потолок

— Доска: 24 штук по 4 м, 0.47 куб. м, 332 кг
