Загрузка сорокафутового контейнера, Владивосток — Петербург

Вид сбоку, разрез по длине

Внутри 12.03 x 2.39 м. Масштаб честный: где пусто на рисунке, там пусто и в контейнере

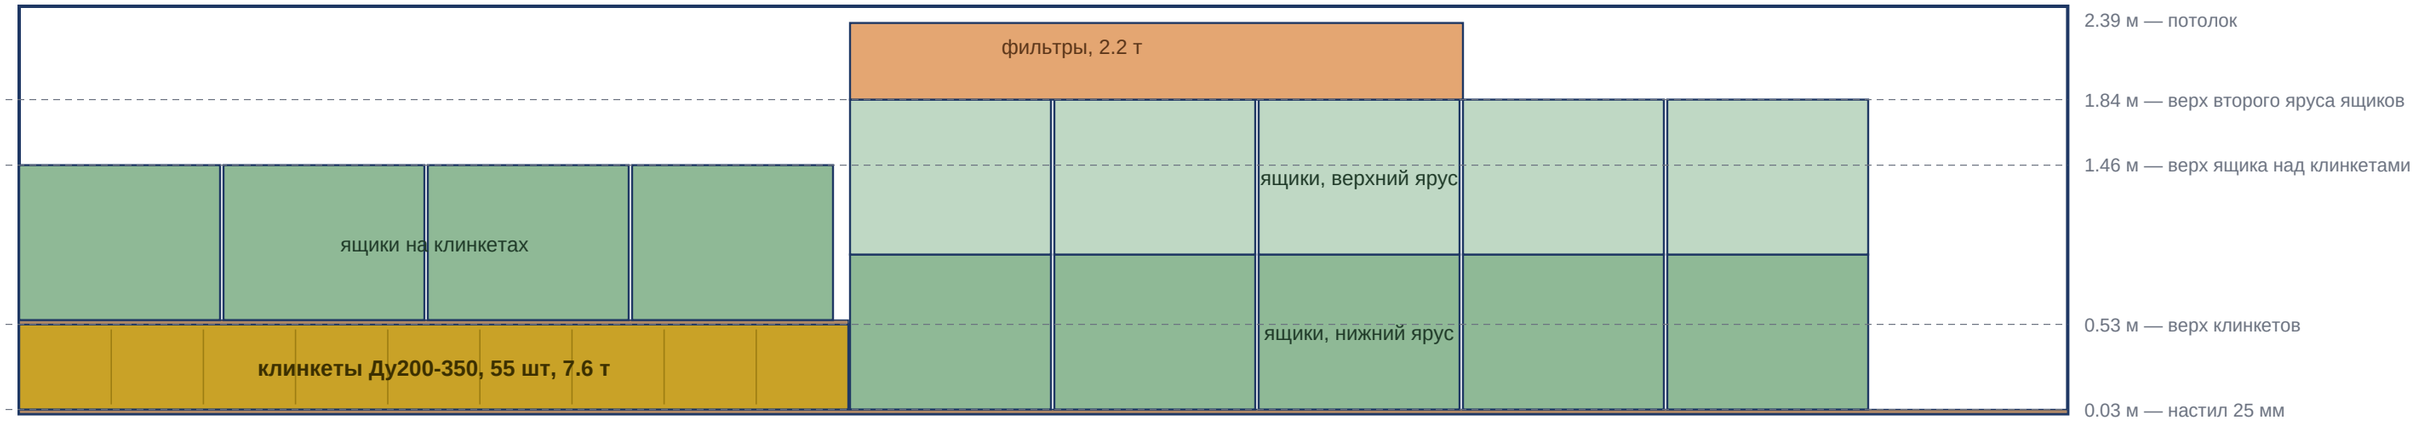

Вид сверху, план пола

Пол 12.03 x 2.35 = 28.3 кв. м. Клинкеты занимают 11.5 кв. м, это 40% пола

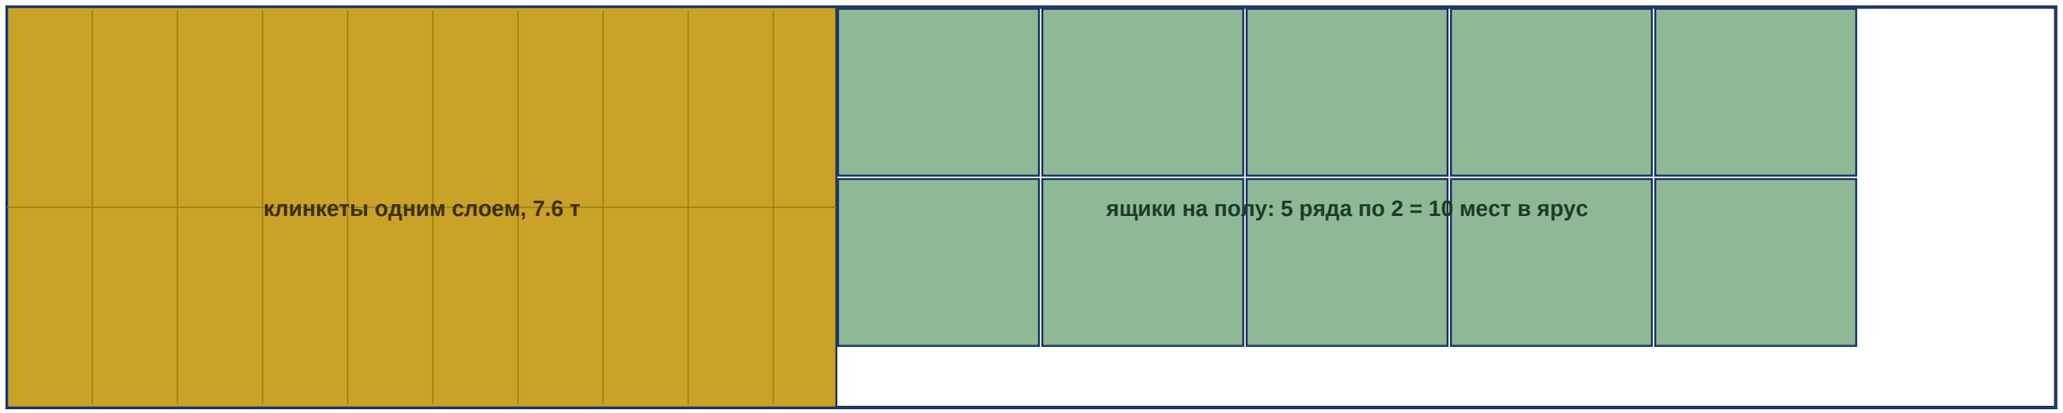

Порядок погрузки

1. Настил необрезной доской 25 мм по всему полу
2. Клинкеты Ду200-350 лежа, один слой: 55 шт, 7.6 т
3. Настил доской поверх клинкетов, над корпусами, а не над маховиками
4. Ящики нижнего яруса, самые тяжелые: всего ящиков 19, 11.3 т
5. Ящики верхнего яруса, что полегче
6. Фильтры сверху, 2.2 т, над углами ящиков

— Всего в контейнере: 284 позиций, 2866 штук, 25.82 т из 26, 37.7 из 67.2 куб. м
— Остается во Владивостоке 1.48 т
— Ящик не выше 0,91 м, иначе второй ярус не встает под потолок
— Доска: 45 штук по 4 м, 0.90 куб. м, 633 кг
— Мест под ящики: 36 — 16 над клинкетами и 20 на свободном полу, везде по два яруса
